

北台灣無障礙運輸產業工會
揪起來讓我們通行無阻
專案管理計畫書

[輔仁大學]

中華民國 2026 年 6 月 4 日

目錄

第 1 章、 專案章程	1
1.1 專案摘要	1
1.2 永續目的和專案目標	1
1.3 專案經費	2
1.4 專案期間	2
1.5 專案執行單位	2
1.6 預期效益	3
第 2 章、 專案工作規劃	4
2.1 整體執行規劃	4
2.2 工作項目規劃	5
第 3 章、 專案時程規劃	7
3.1 專案里程碑	7
3.2 專案時程基準	8
第 4 章、 專案團隊管理	9
4.1 專案成員背景與學習經歷	9
4.2 專案組織與分工	9
第 5 章、 專案預算規劃	11
第 6 章、 專案品質管理	13
6.1 品質規劃	13
6.2 品質保證	13
6.3 品質管制	15
第 7 章、 專案管理規劃	16
7.1 需求變更管理能力、風險與對策	16
7.2 教育訓練、系統演練	16
7.3 儀器設備	16
第 8 章、 有助於本案執行之事項及建議	17
參考文獻	18
雛型網站連結	19
附錄 A 需求訪談紀錄表	20

圖目錄

圖 2-1、專案架構	4
圖 3-1、任務甘特圖	8
圖 4-1、專案組織圖	9
圖 6-1、專案品質保證流程圖	14

表目錄

表 3-1、里程碑查核表	7
表 4-1、各功能組別及人員職掌	9
表 5-1、各項工作單價分析	11
表 5-2、專案人員薪資對應	11
表 5-3、功能細項分析表	12
表 6-1、品質檢查項目表	15

第一章、專案章程

1.1 專案摘要

本專案規劃建構一套「無障礙專屬社交活動與媒合平台」，旨在服務身心障礙者、高齡者、行動不便人士及照顧者。針對傳統市場較缺乏無障礙社交配套之痛點，本平台嘗試從非營利組織（NPO）的角度出發，運用資訊科技輔助弱勢族群建立社交聯繫，降低出行資訊焦慮。

本專案第一階段聚焦於建置「無障礙活動揪團平台」與「工會接送需求媒合系統」，協助使用者建立活動交流與接送服務需求。在系統設計上，前端網頁預計遵循 WCAG 無障礙規範，並規劃串接 Google Maps API 定位服務；功能核心則包含「社交約團」與「需求媒合」，旨在提供無障礙出行的可行性。

1.2 永續目的和專案目標

一、專案與 SDGs 之務實關聯性

- SDG 3.4 促進心理健康：針對行動不便者與照顧者建立集中化活動揪團平台。透過同儕社交與出遊活動，打破「怕麻煩別人」的心理門檻，重建其社交聯繫，實質緩解因社會隔閡產生的孤獨感與焦慮，促進身心靈健康。
- SDG 10.2 促進普遍的社會、經濟和政治包容：系統前端 100% 遵循 WCAG 無障礙網頁規範，保障不同障礙別之數位近用權；搭配專屬活動與交通媒合機制，消除環境資訊不透明所造成的行動障礙，保障弱勢族群平等參與社會活動之權利。
- SDG 11.7 提供安全和包容的綠色和公共空間：前端整合 Google Maps API 定位服務，並深度對接無障礙運輸工會之派遣需求，提升友善運具的資訊透明度與易用性。協助身心障礙者與高齡者安全、無障礙地抵達各類公共與戶外空間。

二、專案預期達成之務實目標

- 社交效率提升：建立集中化揪團平台，取代零散、低效率的社群私下約團流程，有效縮短使用者活動規劃與溝通的時間成本。
 1. 運具稼動率增加：透過接送服務串接模組引導旅遊訂單進入工會體系，活化並提升無障礙專車於週末時段之車輛利用率。
 2. 操作阻力最小化：前端系統遵循 WCAG 無障礙規範，確保介面操作流程之簡便，切實降低身心障礙者使用數位平台時的負擔。

1.3 專案經費

本專案總經費編列為新臺幣 1,017,275 元整（含稅）。其中，為達成社會平權與基礎營運整合目的，特別編列以下專項預算：

1. 無障礙介面開發與易用性測試費用：涵蓋符合 WCAG 規範之設計與測試成本，降低障礙者使用門檻。
2. 工會派遣流程整合與測試費：針對與無障礙運輸工會之異質派遣需求對接，所編列之邏輯開發與第三方營運整合測試費用。
3. Google Maps API 串接與定位服務費：為輔助無障礙人士與司機確認位置環境安全，編列之外部地理資訊定位整合預算。

1.4 專案期間

本專案執行總期程自民國 115 年 7 月 26 日起，至民國 116 年 7 月 31 日止，共計 12 個月。

1.5 專案執行單位

專案由專業軟體開發專案團隊執行，並與「北台灣無障礙運輸工會」深度合作。團隊編制包含專家顧問、專案經理（PM）、系統分析師（SA）、系統設計師（SD）、程式設計師（Developer）、美術視覺設計師及系統測試人員。

為了落實專案的永續指標與老師最重視的「使用者核心痛點」，團隊特別指定核心人員兼任以下特殊職務與稽核工作：

系統分析師（兼任 參與式設計負責人）：負責進行身障使用者訪談、工會司機訪談、訪談資料整理彙整，以及後續 UAT（使用者驗收測試）之流程安排。

美術視覺設計師（兼任 無障礙規範監控官）：負責監控、測試並記錄系統符合 WCAG 無障礙規範之達成率，切實落實數位平權（People）。

系統設計師（兼任 營運效率分析官）：負責審查需求媒合之核心數據，追蹤並記錄運輸工會車輛稼動率之提升狀況。

1.6 預期效益

平台與社會影響力指標

1. 優化社交體驗：交付「智慧揪團媒合」平台，將破碎的旅遊約團流程自動化，大幅縮短使用者活動規劃與溝通時間。
2. 活化交通運能：建立「專業接送派單」系統，優化運輸工會的派遣調度效率，提升週末非尖峰時段之車輛稼動率。
3. 降低操作阻力：提供穩定、安全的無障礙操作介面，實質增加身心障礙人士與同儕互動的機會。

永續概念效益

1. Product (產品)：提供具備揪團媒合與接送派單功能的無障礙專屬旅遊平台。
2. Process (流程)：實現旅遊約團與交通預約自動化，最佳化派車路線並減少空車能耗。
3. People (社會)：提供無障礙人士同儕互動機會，降低出遊孤獨感，落實移動平權。
4. Planet (環境)：透過約團共乘與地圖資訊輔助，優化行車路線以減少數位與實體資源浪費。
5. Prosperity (財務)：透過營運收費系統建立媒合抽成與服務費機制，為工會創造穩定金流。

第二章、專案工作規劃

2.1 整體執行規劃


「無障礙運輸平台」主要是想做出一個系統，幫特定需求使用者、身心障礙朋友還有老人家，提供更友善的運輸媒合與管理。在整體的規劃構想上，打算採用「階段式生命週期模型」來跑這個專案，結合第一章 NPO 組織的目標並導入關鍵永續措施，確保從前期的需求討論、功能設計，到後期的測試跟最後上線，每一步都能順利完成並交出好成果。

本專案以北台灣無障礙運輸產業工會之需求為基礎，透過資訊系統建置，協助身心障礙者、高齡者及其照顧者進行活動參與與接送需求協作，同時提升工會接送服務之管理效率。

為確保專案能依據需求逐步完成規劃、設計、開發、測試及部署等工作，本專案依工作分解結構（Work Breakdown Structure, WBS）規劃為六大階段，包含專案啟動與參與式規劃、系統分析與工程設計、平台核心功能開發、營運與輔助功能建立、系統整合測試，以及部署上線與運作準備。

專案執行期間將透過需求蒐集、系統分析、功能開發、測試驗證及成果交付等程序逐步推動，並以北台灣無障礙運輸產業工會所提供之實務需求作為系統規劃依據，確保系統功能符合實際使用情境。

本專案整體執行流程如下：

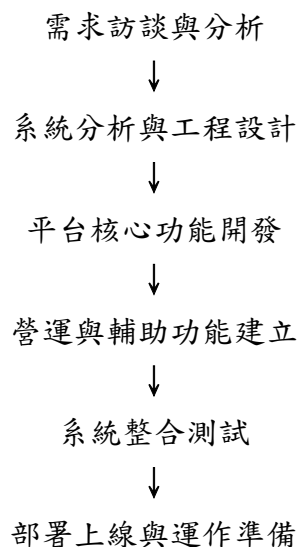

配合我們第一章的規劃與交付作業的期程，我們把整個工作分解結構（WBS）分成三大期程、6 個主要的工作項目如圖 2-1 所示。



圖 2-1、專案架構

2.2 工作項目規劃

一、專案啟動與參與式規劃

本階段主要進行專案管理與執行規劃，確認專案範圍、工作內容及時程安排。並透過需求訪談與分析，蒐集北台灣無障礙運輸產業工會及相關使用情境需求，作為後續系統設計依據。同時完成系統需求與量化指標規劃，建立專案成果評估基準。

二、系統分析與工程設計

本階段依據需求分析結果進行系統架構規劃，完成系統架構圖、資料庫設計、流程設計及相關技術文件撰寫。此外，亦完成系統介面設計與開發環境建置，建立後續系統開發所需之基礎環境與設計規格。

三、平台核心功能開發

本階段建置平台主要功能，包括使用者與權限管理功能、活動參與與揪團機制、接送需求協作機制以及訂單與行程管理機制。

使用者可透過平台進行會員註冊與登入，建立活動資訊並參與揪團活動；工會則可透過接送需求送單及相關管理功能，協助進行接送服務安排與資訊管理。

四、營運與輔助功能建立

本階段建置平台營運所需之輔助功能，包括信任與回饋機制，以及通知與營運管理後台。

信任與回饋機制提供使用者互評及意見回饋功能；通知功能協助傳遞活動與接送相關資訊；營運管理後台則提供會員管理、活動管理、接送紀錄查詢及營運數據檢視等功能，以協助工會掌握平台運作情形。

五、系統整合測試

本階段完成系統功能測試與整合測試，確認各項功能皆可正常運作。並進行無障礙檢測與資訊安全檢測，確認系統符合基本使用需求與資訊安全要求。

測試完成後，依據測試結果進行系統修正與版本優化，以提升系統穩定性與使用體驗。

六、部署上線與運作準備

本階段將系統部署至雲端環境，完成功能確認與環境驗證。同時進行系統效能調校，確認網站運作狀況及使用效能，作為正式上線前之準備工作。

完成相關測試與確認後，系統將進入正式運作階段。

第三章、專案時程規劃

3.1 專案里程碑

為確保專案能如期、如質完工，本計畫書將開發時程解構為三大里程碑。每個里程碑皆代表一個重要階段的重大成果交付與品質檢核點。表 3-1 為本專案之里程碑查核表，團隊將以此基準進行進度追蹤，確保各階段之核心模組與文件皆能順利通過驗收：

表 3-1、里程碑查核表

階段名稱	主要交付標的	預計完成時間
專案規劃與設計	專案規劃書、系統設計文件、介面設計	4 個月 (2026/11/30)
核心與營運功能開發	平台核心程式、營運後台系統	4 個月 (2027/4/3)
系統功能測試與雲端部署	系統功能與整合測試報告、雲端正式網站	4 個月 (2027/7/31)

3.2 專案時程基準

依據三大里程碑之時程規劃，本團隊進一步將系統分析、核心開發及環境部署等任務進行時間排程。圖 3-1 為本專案之時程基準甘特圖，明確呈現各項工作項目的實施期程與工作進度配置，以利團隊成員與相關利害關係人即時掌握目前的專案執行現況。



圖 3-1、任務甘特圖

第四章、專案團隊管理

4.1 專案成員背景與學習經歷

本團隊由資訊管理相關領域學生組成，具備專案管理、系統分析、系統設計、程式開發、資料庫管理及使用者介面設計等專業能力。團隊成員於課程學習期間曾參與多項資訊系統開發實作與專題製作，熟悉系統開發生命週期、需求分析、系統設計、程式開發、系統測試及文件撰寫等工作流程。

團隊成員透過課程專題及實作訓練累積系統開發經驗，並具備良好的溝通協調與團隊合作能力，能依照專案目標與時程規劃完成各階段工作，展現執行本專案所需之能力與品質管理能力。

4.2 專案組織與分工

本專案採矩陣式專案組織架構（組織架構圖如圖 4-1 所示），由專家顧問提供專業指導，專案經理負責統籌專案執行與資源分配，系統分析師、系統設計師、程式設計師、美術視覺設計師及系統測試人員依據專長分工合作，以共同完成系統開發工作，各功能組別之具體工作內容與人員職掌如表 4-1 所示。

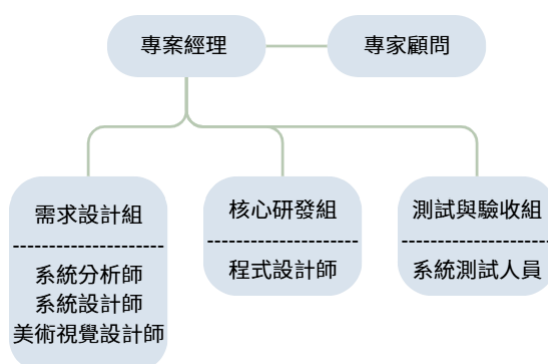


圖 4-1 專案組織圖

表 4-1、各功能組別及人員職掌

分組	職位	負責工作
技術與實務指導	專家顧問	負責提供專案前期的策略規劃指導，並針對系統需求與關鍵量化指標給予高階專業諮詢與修訂建議。

表 4-1、各功能組別及人員職掌

分組	職位	負責工作
最高決策與核心控管	專案經理	負責統籌整個專案的起始、時程控管與資源調配，並跨組別協調溝通，確保團隊在時程內達成各階段目標。
需求與設計	系統分析師	負責前期使用者需求訪談與功能分析，並將其轉化為系統規格，同時在後期負責確認系統驗證符合原始需求。
	系統設計師	負責系統底層工程設計，包含撰寫資料庫結構（Schema）、API 規格以及系統技術架構文件。
	美術視覺設計師	負責使用者介面（UI）設計與動態原型（Prototype）繪製，並提供核心功能與後台系統的視覺優化。
核心研發	程式設計師	全權負責平台所有核心功能與營運後台系統的程式碼撰寫、雲端環境部署，並針對測試結果進行效能調校與漏洞修正。
測試	系統測試人員	負責整體系統的品质把關，全面執行功能測試、整合測試以及資安檢測，並彙整測試報告與 Bug 清單交由工程師優化。

第五章、專案預算規劃

本專案總工作期程自 115 年 7 月 26 日起，至 116 年 7 月 31 日止，預計 12 個月，依本專案經費額度內，參照按行政院主計總處主計資訊處「資訊服務委外經費估算原則」估算總經費預算為新臺幣 997,200 元整（含稅），如表 5-1 所示。

各工作投入人力成本係參照勞動部 113 年 7 月職類別薪資調查結果「專業、科學及技術服務業」項下「研究發展服務業」實際薪資（表 5-2）估算得之，請參照表 5-2。依各工作項目估算所需投入人力薪資、軟硬體設備、材料等細項成本，如表 5-3 所示。

表 5-1、各項工作單價分析

分項工作經費表	單價
專案啟動與參與式規劃	212,514
系統分析與工程設計	172,720
平台核心功能開發	259,061
營運與輔助功能建立	123,081
系統功能與整合測試	133,596
部署上線與維運準備	96,228
總計	997,200

單位：新台幣（元）

表 5-2、專案人員薪資對應

勞動部職類別薪資統計	經常性薪資	對應專案成員職稱
(100000)主管及監督人員	100,747	專家顧問
(242100)專案管理師(含經營管理顧問)	64,624	專案經理

表 5- 2、專案人員薪資對應

勞動部職類別薪資統計	經常性薪資	對應專案成員職稱
(250000)資訊及通訊專業人員(含系統分析、程式設計、資料庫及網路專業人員)	71,758	系統分析師、程式設計師、系統設計師
(217200)平面及多媒體設計師	48,394	美術視覺設計師
(351090)資訊管理及維護技術員	43,134	系統測試人員

表 5-3、功能細項分析表

服務項目	規格	單價	單位	數量	合計
專案啟動與參與式規劃	專案經理	64,624	人月	0.6	38,774
	系統分析師	71,758	人月	2.0	143,516
	專家顧問	100,747	人月	0.3	30,224
系統分析與工程設計	系統分析師	71,758	人月	0.6	43,055
	系統設計師	71,758	人月	1.2	86,110
	美術視覺設計師	48,394	人月	0.9	43,555
平台核心功能開發	程式設計師	71,758	人月	2.8	200,922
	美術視覺設計師	48,394	人月	0.4	19,358
	系統測試人員	43,134	人月	0.4	17,254
	系統分析師	71,758	人月	0.3	21,527
營運與輔助功能建立	程式設計師	71,758	人月	1.2	86,110
	美術視覺設計師	48,394	人月	0.2	9,679
	系統測試人員	43,134	人月	0.3	12,940
	系統分析師	71,758	人月	0.2	14,352
系統功能與整合測試	程式設計師	71,758	人月	0.5	35,879
	系統測試人員	43,134	人月	1.6	69,014
	系統分析師	71,758	人月	0.4	28,703
部署上線	系統測試人員	43,134	人月	0.9	38,821
	系統分析師	71,758	人月	0.2	14,352
	程式設計師	71,758	人月	0.4	28,703
	系統設計師	71,758	人月	0.2	14,352

第六章、專案品質管理

為確保本專案所建置之「無障礙旅遊與社交媒合平台系統」符合功能需求、操作穩定性與使用便利性，本專案將於系統開發過程中導入品質管理機制，並透過品質規劃、品質保證及品質管制等方式，提升系統整體品質與使用者滿意度。

6.1 品質規劃

本專案為「無障礙旅遊與社交媒合平台系統」，主要提供行動不便者、陪同家屬及照護者進行活動查詢、社交媒合與同行安排等服務。為確保系統功能符合需求、平台操作穩定及使用流程具備良好便利性，本專案於系統開發初期即建立品質管理目標，作為後續系統分析、功能開發、測試與驗收之依據。

在功能完整性方面，系統功能需完全符合需求分析文件與專案規劃內容，確實涵蓋會員身分管理、活動管理、社交媒合、接送叫車、評價系統及會員活動紀錄等核心功能項目，以確保整體系統機制的完整落實。

在操作便利性與無障礙使用考量上，由於平台主要使用對象為行動不便之輪椅族及其照顧者，系統介面設計將以操作簡單、資訊清楚及流程一致性為原則，並針對文字可讀性、按鈕大小、操作流程簡化及不同裝置之基本瀏覽需求進行規劃，從而降低使用門檻並提升操作便利性。

在系統穩定性與資訊安全性方面，系統應維持基本運作穩定性及資料正確性，確保會員、活動、行程與回饋等資料能正確儲存及顯示，並於發生操作錯誤時提供適當提示。同時，系統將建立帳號驗證、角色權限管理及個人資料保護機制，限制不同身分使用者可存取的功能與資料範圍，以維護系統資料安全並降低未經授權存取的風險。

6.2 品質保證

為確保專案開發過程符合預定品質目標，本專案採用流程圖法進行品質管理，並採取以下品質保證措施：

一、需求與設計確認

由專案經理及系統分析師確認使用者需求、系統範圍與驗收條件，再由系統分析師、系統設計師及美術視覺設計師共同審查功能流程、系統架構與介面設計，確認設計內容符合需求後，始進入功能開發階段。

二、功能測試與問題修正

功能開發完成後，由系統測試人員依據需求文件及品質檢查項目執行功能測試、整合測試、無障礙檢查及資訊安全驗證。若測試結果未符合品質要求，應記錄問題並交由相關人員修正，完成複測後始得進入下一階段。

三、部署與成果確認

系統部署後，由專案團隊確認正式環境中的主要功能、操作介面及資料顯示是否正常。完成上線驗證後，再進行技術文件整理與成果交付。

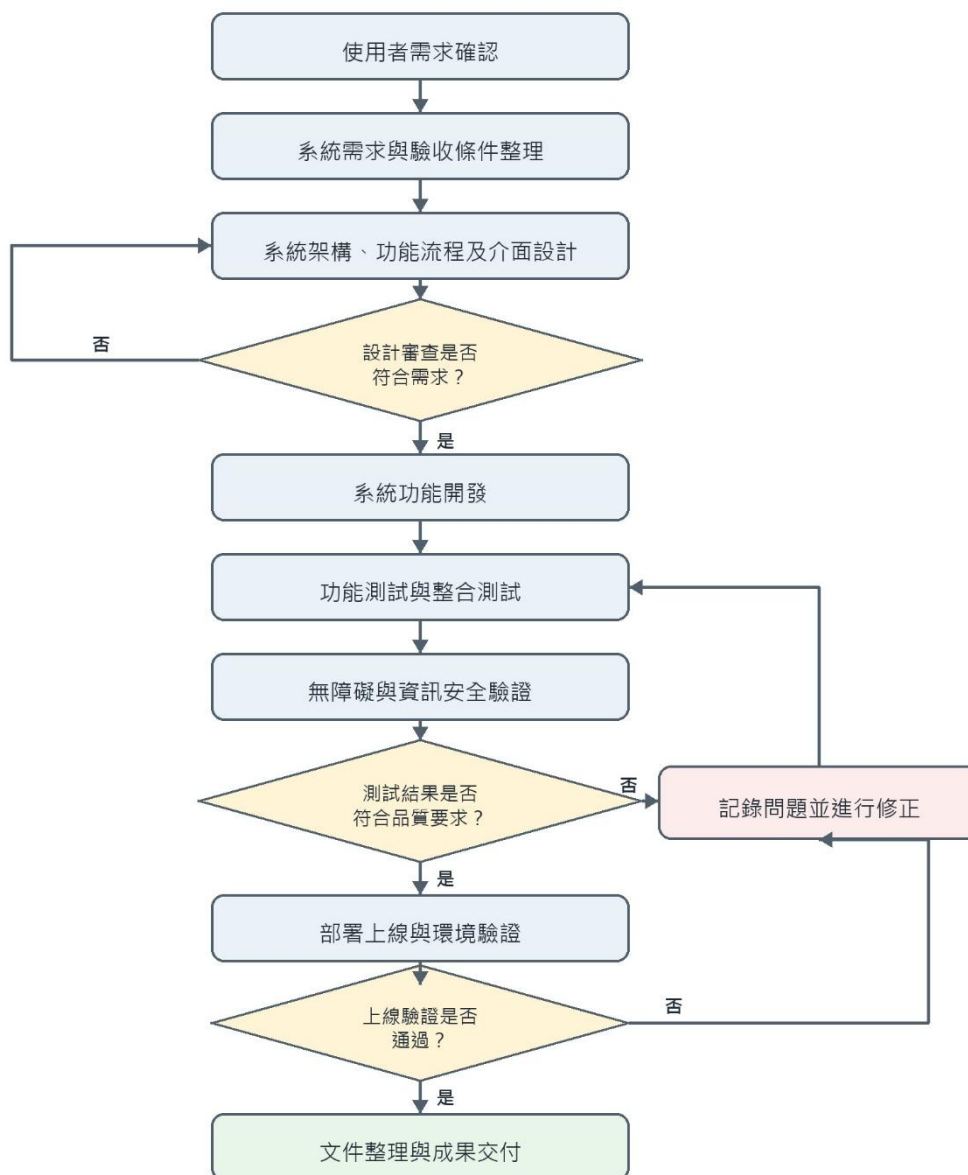


圖 6-1、專案品質保證流程圖

專案品質保證流程圖呈現需求確認、系統設計、功能開發、測試驗證、問題修正、部署上線及成果交付等階段；未通過審查或測試的項目，須完成修正與複驗後才能進入下一階段。

6.3 品質管制

本專案將於系統開發完成後進行功能測試與驗收作業，以確認系統可正常運作，依各工作項目所需檢查項目，如表 6-1 所示。

表 6-1 品質檢查項目表

品質檢查項目	檢查內容
使用者與權限管理	確認會員註冊、登入及權限功能可正常運作
活動參與與揪團機制	確認活動建立、修改、查詢、參與、留言及揪團等功能可正常運作。
接送需求協作機制	確認接送需求資訊可正確登記、修改、查詢及提供相關人員協調使用。
行程與會員活動紀錄管理	確認活動行程、參與資訊及會員歷史活動紀錄可正確建立、修改、查詢與顯示。
信任與回饋機制	確認使用者可針對活動或服務體驗提交回饋，且相關內容可正確儲存與顯示。
操作流程與介面	確認主要操作流程清楚、頁面呈現一致，並符合基本無障礙使用要求。
資料正確性	確認會員、活動、接送需求、行程及回饋資料可正確儲存、修改與顯示。
資訊安全性	確認帳號驗證、角色權限及個人資料保護機制可正常運作。

第七章、專案管理規劃

本專案將採用系統化的專案管理方法，以確保需求者接送與揪團服務系統順利建置並有效運行，具體說明：

7.1 需求變更管理能力、風險與對策

在需求變更管理方面，本專案建立了完善的需求管理流程，專門針對使用者與工會司機的核心需求變更進行嚴格的評估與核准。透過專案變更控制文件的編製與變更審查會議的確認，能有效管控任何潛在的需求變定，確保所有調整皆在可控範圍內，不致影響專案的既定時程與開發成本。

在風險分析與對策方面，團隊在專案初期即全面進行風險識別與評估，特別針對使用者體驗不佳、技術串接延遲等可能面臨的技術與時程風險，制定了嚴密的因應對策。例如針對核心模組擬定備援技術替代方案，以確保在遇到技術瓶頸時能迅速切換，降低對專案推進的衝擊。

在軟體測試與品質保證方面，本專案嚴格落實單元測試、整合測試與系統測試，並特別將無障礙網頁規範與資安弱點掃描納入測試標準，以確保所有功能皆完全符合當初的系統需求。

7.2 教育訓練、系統演練

在教育訓練方面，本專案將針對一般使用者與工會管理員，提供全面且完整的系統操作訓練課程。透過操作手冊，並搭配實際的機台演練，有效協助相關工作人員與營運團隊在短時間內熟悉身障接送機制、訂單行程安排以及營運管理後台的各項核心功能。

在系統演練方面，在平台正式上線之前，團隊將全面進行系統演練模擬與壓力測試。此舉旨在測試系統在實際操作環境下的實時效能與長期穩定性，提早發現潛在的系統瓶頸並進行調校，以確保系統表現完全符合當初規劃的營運需求與服務水準。

7.3 儀器設備

在軟硬體設備方面，本專案全面導入雲端伺服器與虛擬化技術作為系統架構的底層基礎，並於開發前期運用相關設計工具進行使用者界面的精準規劃。同時，團隊搭配高效能的資料庫管理系統，進行整體平台資料的建置、維護與集中管理，以確保系統資源能發揮最大彈性與運作效能。

在資料保全方面，系統嚴格實施存取控制機制，限制非授權人員接觸專案核心資料。使用加密技術保護個人隱私與資安，並將所有系統資料存放於專用的雲端安全空間內，以確保整體系統資料的機密性、完整性與不可篡改性。

整體專案將透過標準化的管理流程及有效的風險控制，確保專案執行效率與系統運行穩定，提供持續維護與支援服務，達到專案目標。

第八章、有助於本案執行之事項及建議

其他有助於本案執行之創意加值服務規劃或建議：

- **最佳化接送路徑推薦：** 加值導入路徑最佳化演算法，自動幫工會司機計算最平穩、省油的接送路線，縮短乘客等候時間並降低營運成本。
- **無障礙語音輔助輸入：** 輔助手部操作不便與年長之使用者，於自主揪團與送單功能加值導入語音轉文字技術，使用者只需口述即可自動填寫表單。

參考文獻

Project Management Institute (PMI), A Guide to the project management body of knowledge, 6th ed. 專案管理知識體指南—第 6 版，PMI 國際專案管理學會譯，2018，社團法人國際專案管理學會台灣分會。

雛型網站連結

<https://ai.studio/apps/de47a29d-f3e4-4bee-ae66-49164dfe6023?fullscreenApplet=true>

附錄 A 需求訪談紀錄表

諮詢提綱	回覆摘要
平常資金的來源？	運輸費其實不是我主要的收入來源。我們提供加值服務，例如幫忙上下樓、貼心服務。我跟舞台劇老師學習，將每一場出去的服務視為一場真人的「秀」。司機需要接受舞台劇表演、語言訓練與肢體訓練，讓客戶感到感動。我們的小費收入往往比車資還高，車資大約 1000 元，但小費有人拿過 1 萬 2，甚至有同學拿過 18 萬。錢從來不是問題，關鍵在於服務值多少錢。當你解決了人家無法解決的困難（如凌晨兩點載送 120 公斤的急診回診），你就創造了被需求的感覺，給了他們付錢的理由。就像海底撈吃的是情境氣氛，我們則是真人的真實秀。
關於餐廳無障礙地圖的部分，想要加入「線」的元素，因為現在看起來只有點（餐廳）。Google 地圖也有無障礙功能，有沒有可能結合這些？	就算 Google 現在有了，我們還是可以從使用者體驗出發，帶身障者進行採訪與體驗。點加起來會變成線，線再變成面。如果桃園 100 間店中只有你做無障礙資訊，市長或相關單位就會感興趣，這就是公關關係。當規模做到全台灣，Google 甚至可能花錢買斷你的資訊。目前雖然有人做資料共享平台，但很少人花時間整理。對交通業來說，有了地圖就能對接車輛，甚至對接蛋糕店、魔術表演等商業模式。你不一定要從地圖本身賺錢，而是應對場景去創造商業幻想。
每次運輸的時候就只能載一個客人嗎？	我們家有可以上兩個輪椅的車，甚至是全台灣第一個做到有五個輪椅可以一起上的。
五個輪椅是載在一台車上嗎？	那是九人座的車，持有小客車駕照就可以開。我們家也有合法載三個輪椅的車。
所以平常合作的話，都是跟市長還是跟誰对接？	我選擇跟市長对接，因為市長層級比較有機會落實。我們有一個政策：如果當地的選區議員願意支持，我就讓該選區有車，否則就沒車。我會找有關係的人講故事，如果你們願意把地圖做好，我可以跟他們說這群年輕人想做有意義的事，請他們贊助或幫忙。
關於共乘，什麼情況可以共乘？共乘有沒有加費？另外，輪椅族在家有孤獨感，如果可以共乘，是不是可以開一個類似「同樂會」的概念，一起去某個地方玩？	這樣就會延伸成旅遊業，你就是團長（團主）。這稱為無障礙旅遊或無障礙社交。你可以先找里長合作，開發想要出遊的案源，報名滿五個人就可以走行程，這就是旅行社的前哨站，後續能與旅行社抽成。這是一個社交網絡平台，四個人就能湊一桌麻將。我們甚至帶過長輩出來看報紙、寫書法，滿足他們的文青感與「情緒價值」。針對宗教背景（如白沙屯媽祖活動），長輩希望透過虔誠讓身體更好，你可以帶他們去並講述神蹟故事，讓他們心靈有寄託。這可以透過收費、會費或捐款的方式運作。
如果他們喜歡，可能就會變成一個穩定的支出來源？	是的。這就是一個可以發展的題目：無障礙旅遊。
