

北台灣無障礙運輸產業工會

無礙同行

專案管理計畫書

執行單位：餓龍咆哮

成員：陳欣妤、高子晴、陳珮頌、鄭宇恩、周冠綸

中華民國 115 年 6 月 11 日

目錄

第 1 章	專案章程	4
1.1	專案摘要	4
1.2	永續目的和專案目標	4
1.3	專案經費	4
1.4	專案期間	4
1.5	專案執行單位	5
1.6	預期效益	5
第 2 章	專案工作規劃	6
2.1	整體執行規劃	6
2.2	工作項目規劃	6
	一、專案需求分析與功能規格規劃	6
	二、核心功能模組開發	7
	三、系統平台與共用基礎	7
	四、推廣執行與合作導入	7
第 3 章	專案時程規劃	8
3.1	專案里程碑	8
3.2	專案時程基準（甘特圖）	9
第 4 章	專案團隊管理	10
4.1	專案組織架構	10
4.2	各功能組別及人員職掌	11
	詳細人員職責，如下圖 4-2 所示	11
第 5 章	專案預算規劃	12
5.1	專案總經費	12
5.2	各功能模組經費彙整表	12
5.3	人員薪資對應表	13
第 6 章	專案品質管理	15
6.1	品質規劃	15
6.2	品質保證	15
6.3	品質管制	15
第 7 章	專案管理規劃	16
7.1	需求變更管理	16
7.2	風險分析與因應對策	16
7.3	教育訓練計畫	17
7.4	系統部署與保固	17
第 8 章	有助於本案執行之事項及建議	18
8.1	創意加值服務	18
8.2	建議事項	18
	參考文獻	19
	附錄 A 系統離型網站	20
	附錄 B	21

圖目錄

圖 2-1 專案架構.....	6
圖 3-1 任務甘特圖.....	9
圖 4-1 專案組織架構表	10

表目錄

表 1-1 利益相關者合作模式表	5
表 3-1 里程碑查核表	8
表 4-1 專案組織架構表	10
表 4-2 各功能組別及人員職掌	11
表 5-1 各功能模組經費彙整表	12
表 5-2 人員薪資對應表	13
表 5-3 各項工作單價分析	13
表 7-1 風險分析因應對策	16
表 7-2 教育訓練規劃	17

第1章 專案章程

1.1 專案摘要

「無礙同行」是由餓龍咆哮團隊為北台灣無障礙運輸產業工會規劃執行的共創無障礙資訊分享平台(以下簡稱本平台)。本專案利用資訊科技打破環境黑洞，打造輪椅族專屬的共創分享平台，讓獨立出門與社交從「挑戰」變為「日常」。

本平台採用輕量化 PWA (Progressive Web App) 架構開發，使用者無須下載 App 即可透過瀏覽器快速查詢，並支援離線查看已緩存的地圖，結合 AI 影像量測、動態無礙燈號、揪團無礙聚、無礙領航員勳章及商家無礙健康檢查表等核心功能，建構完整的無障礙資訊生態系。

1.2 永續目的和專案目標

本專案與聯合國永續發展目標 (SDGs)：

- SDG 10 減少不平等：保障身障者社會參與權，打破環境資訊不透明所造成的行動障礙。
- SDG 11 永續城鄉：推動友善實體空間，促進商家主動改善無障礙設施。
- SDG 3 良好健康與福祉：打破「怕麻煩別人」的心理陰影，重建輪椅族的社交聯繫與心理健康。

本專案的核心目標，是希望透過資訊整合與社群共創，降低使用者在行動與參與上的不確定性。首先，我們希望填補資訊黑洞，讓使用者在出門前就能掌握環境狀況與可用資源，降低因資訊不足造成的焦慮與無效移動。其次，透過串連在地社交資源與支持網絡，協助使用者重新建立社交聯繫，打破心理門檻與社會隔閡，讓人與人之間的互動更加容易開始。最後，系統也將導入遊戲化與共創機制，鼓勵使用者長期參與資料回報與維護，逐步形成一個可持續運作的社群生態系，讓資料品質與服務價值能隨著使用者參與而持續提升。

1.3 專案經費

本專案總經費編列為新臺幣 853,090 整(含稅)。其中，為達成社會與環境永續目的，特別編列並優化相關特殊預算，包含：

1. 無障礙介面與特殊適配設計費用(涵蓋高對比、單手操作及語音輔助優化等跨功能開發)
2. AI 影像量測與自動法規判定模組研發費用(減少人工出差盤查之碳足跡)
3. 推廣與教育訓練專屬費用(包含辦理 8 場次志工培訓與宣導之場地、講義及餐點)

1.4 專案期間

本專案總執行週期預計為 10 個月，自民國 115 年 7 月 1 日起至民國 116 年 4 月 30 日止。

1.5 專案執行單位

本專案之技術開發與實施由「餓龍咆哮」核心開發團隊執行。團隊編制包含總經理、專家顧問、專案經理（PM）、功能經理、系統分析師、AI 工程師、程式設計師、資料庫設計師、系統測試與維護技術員、及客服人員。

為了落實永續指標，團隊於「專案管理組」特別指定中階主管（監督人員）兼任「永續指標稽核官」，負責：

- 監控與記錄平台「無紙化比例」與減碳實效
- 審查與盤點雲端調用效率，防止無效數位資源浪費（數位碳足跡管控）
- 追蹤並記錄線下「無礙認證 QR Code」友善生態圈的店家增長與志工服務時數核銷

1.6 預期效益

平台數據指標

- 第一年累積全台數千筆精準的無障礙數據
- 吸引逾千名活躍使用者，建立核心社群生態圈
- 使用者回饋之資訊正確率持續維持在高水準

社會影響力指標

- 積極拓展合作渠道，預期建立具備規模之餐飲「無障礙認證」合作體系
- 布建線下量測量能，召集並培訓足額之專業「無障礙資訊志工」團隊

永續營運指標

- 建立持續性的社群回報機制，確保地圖資訊動態更新
- P5 永續概念：
 - ◆ Product：提供精準無障礙資訊，提升使用品質
 - ◆ Process：自動化群眾外包維護機制，降低人事成本
 - ◆ People：保障輪椅族等弱勢族群的出行尊嚴
 - ◆ Planet：推動友善空間，永續城鄉發展
 - ◆ Prosperity：建立商家、志工、使用者共贏的商業生態系，下表 1-1 為利益相關者合作模式表

表 1-1 利益相關者合作模式表

利益相關者	夥伴關係定位	核心合作模式與價值
社福單位/身障福利中心	合作夥伴	協助推廣、提供用戶資源
交通部/地方交通局	政府夥伴	提供 Open Data、政策支援

第2章 專案工作規劃

2.1 整體執行規劃

本專案以「無障礙出行資訊整合與即時支援」為核心，透過需求分析、功能開發、平台建置與後續營運推廣等階段，逐步完成系統規劃與服務落地。整體執行將依據使用者實際痛點出發，針對無障礙資訊不透明、場域可達性難以判斷、資料更新不即時及出行支援不足等問題，建立具備查詢、判斷、回報、管理與互動功能的平台。

以下為本專案之工作分解結構表：

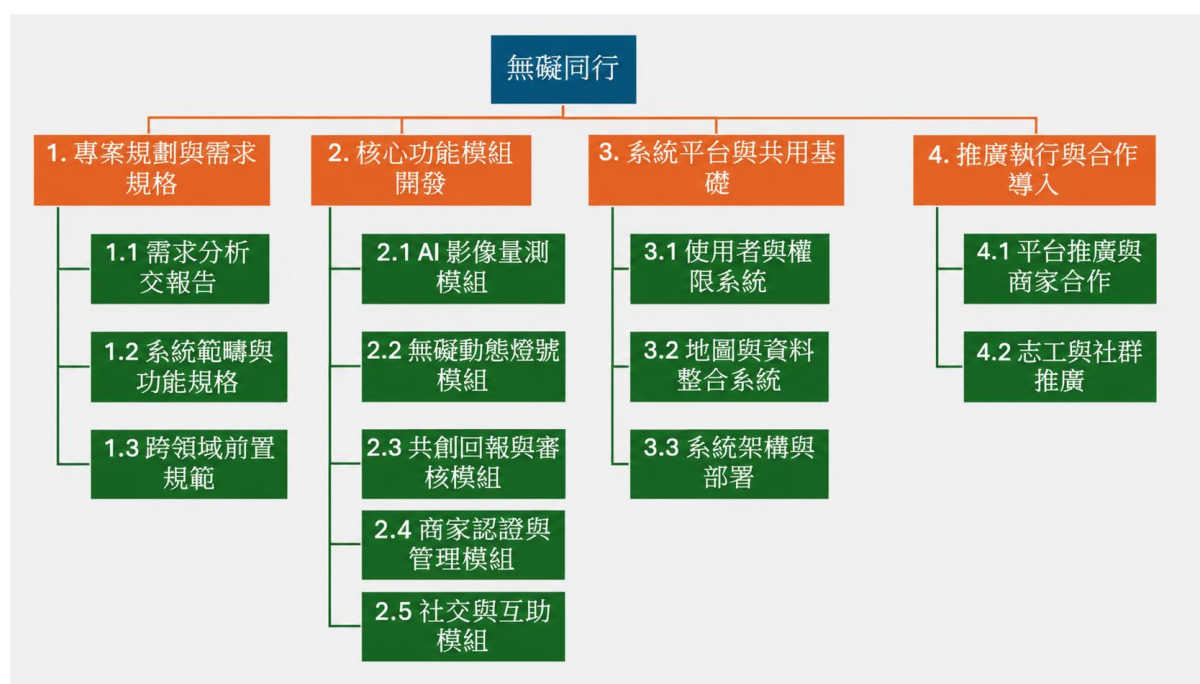


圖 2-1 專案架構

2.2 工作項目規劃

一、專案需求分析與功能規格規劃

本階段主要解決的是使用者在無障礙出行前，難以取得清楚、可靠且符合自身需求資訊的問題。

對輪椅使用者、行動不便者、高齡者及照顧者而言，出門前往往往需要確認入口是否有門檻、坡道是否安全、店內空間是否足夠、現場是否有人可協助等資訊。然而，現有資訊常分散在網路評論、照片或個人經驗中，缺乏一致的判斷標準，導致使用者即使事前查詢，仍可能到現場才發現無法順利進入或使用。

因此，本階段透過利害關係人需求分析、使用者情境分析、無障礙需求與風險評估，釐清不同使用者在查詢、前往、進入場域與回報資訊時遇到的痛點。同時，透過核心功能需求規格、服務藍圖、MVP 功能範圍與 AI/NLP 模型需求規格，將使用者需求轉化為後續系統開發的明確依據。

二、核心功能模組開發

本階段主要解決的是使用者無法即時判斷場域是否可進入、資訊不夠精準，以及缺乏回報與協助管道的問題。

透過 AI 影像量測模組，使用者或商家可上傳現場照片，讓系統協助判斷坡度、門檻或出入口狀況，降低僅靠文字描述造成誤判的風險。透過無礙動態燈號模組，平台可將場域目前的無障礙狀態以簡單明確的方式呈現，讓使用者能快速判斷是否適合前往。

此外，共創回報與審核模組可讓使用者、志工或商家共同補充現場資訊，並透過審核機制提升資料可信度。商家認證與管理模組則提供商家主動更新無障礙資訊的管道。社交與互動模組則進一步協助使用者在有需要時尋求志工、同行者或社群支援。

三、系統平台與共用基礎

此階段主要解決的是平台使用流程不順、資料分散、系統難以穩定支援服務運作的問題。

對使用者而言，無障礙資訊若分散在不同來源，會造成查詢不便，也難以判斷資料是否一致。因此，本階段透過使用者與權限系統、地圖資料整合、店家與場域資料庫、後端 API 與雲端資料庫建置，建立一個穩定的共用平台基礎。

使用者可以透過統一的平台查詢無障礙資訊；商家可以維護自身資料；管理者可以審核與管理回報內容。透過權限控管，也能避免資料被任意修改，提升平台資訊的可信度。

四、推廣執行與合作導入

此階段主要解決平台上線初期使用率不足、資料來源有限，以及缺乏商家與社群合作資源等問題。

無障礙平台若只完成一次性的建置，仍可能面臨使用者不足、資料蒐集管道有限，以及服務難以擴散等情況。若缺乏使用者、店家與社群的參與，平台將難以持續累積實際場域資訊，也不易建立穩定的使用基礎。

因此，本階段將透過短期的平台推廣、商家合作，以及志工與社群推廣，協助提升平台初期曝光度，吸引更多使用者、店家與社群加入，並擴大資料蒐集與回報來源。同時建立初步的合作網絡與推廣管道，協助平台在上線初期累積使用者與合作資源。

本階段以推廣啟動、合作資源串接及社群參與導入為主，不包含長期行銷推廣、社群經營或平台代營運服務。

第3章 專案時程規劃

3.1 專案里程碑

本專案總工作期程自 115 年 7 月 1 日起，至 116 年 4 月 30 日止，共 6 個里程碑：

表 3-1 里程碑查核表

編號	階段名稱	完成期限	主要交付標的
1	專案規劃與需求規格	決標日起 31 個日曆天內 (2026/7/31)	利害關係人需求分析報告、使用者情境分析、無障礙需求與風險評估、核心功能需求規格書、服務藍圖、MVP 功能範圍定義、AI/NLP 模型需求規格
2	核心功能模組開發	決標日起 147 個日曆天內 (2026/11/24)	AI 影像量測模組、無礙動態燈號模組、共創回報與審核模組、商家認證與管理模組、社交與互助模組
3	系統平台與共用基礎	決標日起 154 個日曆天內 (2026/12/1)	使用者與權限系統、地圖與資料整合系統、PWA 系統架構、後端 API 架構、雲端資料庫建置
4	系統整合測試與修正	決標日起 182 個日曆天內 (2026/1/31)	核心功能整合測試、權限與資料測試、地圖資料整合測試、使用者操作流程測試、前後端串接測試、錯誤修正與階段驗收
5	推廣執行與合作導入	決標日起 196 個日曆天內 (2027/3/30)	平台推廣方案、商家合作方案、志工與社群推廣方案
6	辦理專案結案	決標日起 215 個日曆天內 (2027/4/30)	最終功能驗收、系統文件與操作說明、驗收報告、版本紀錄、專案成果文件與結案交付

3.2 專案時程基準（甘特圖）

本專案時程安排如表 3-1 任務甘特圖所示（2026 年 7 月 至 2027 年 4 月）：

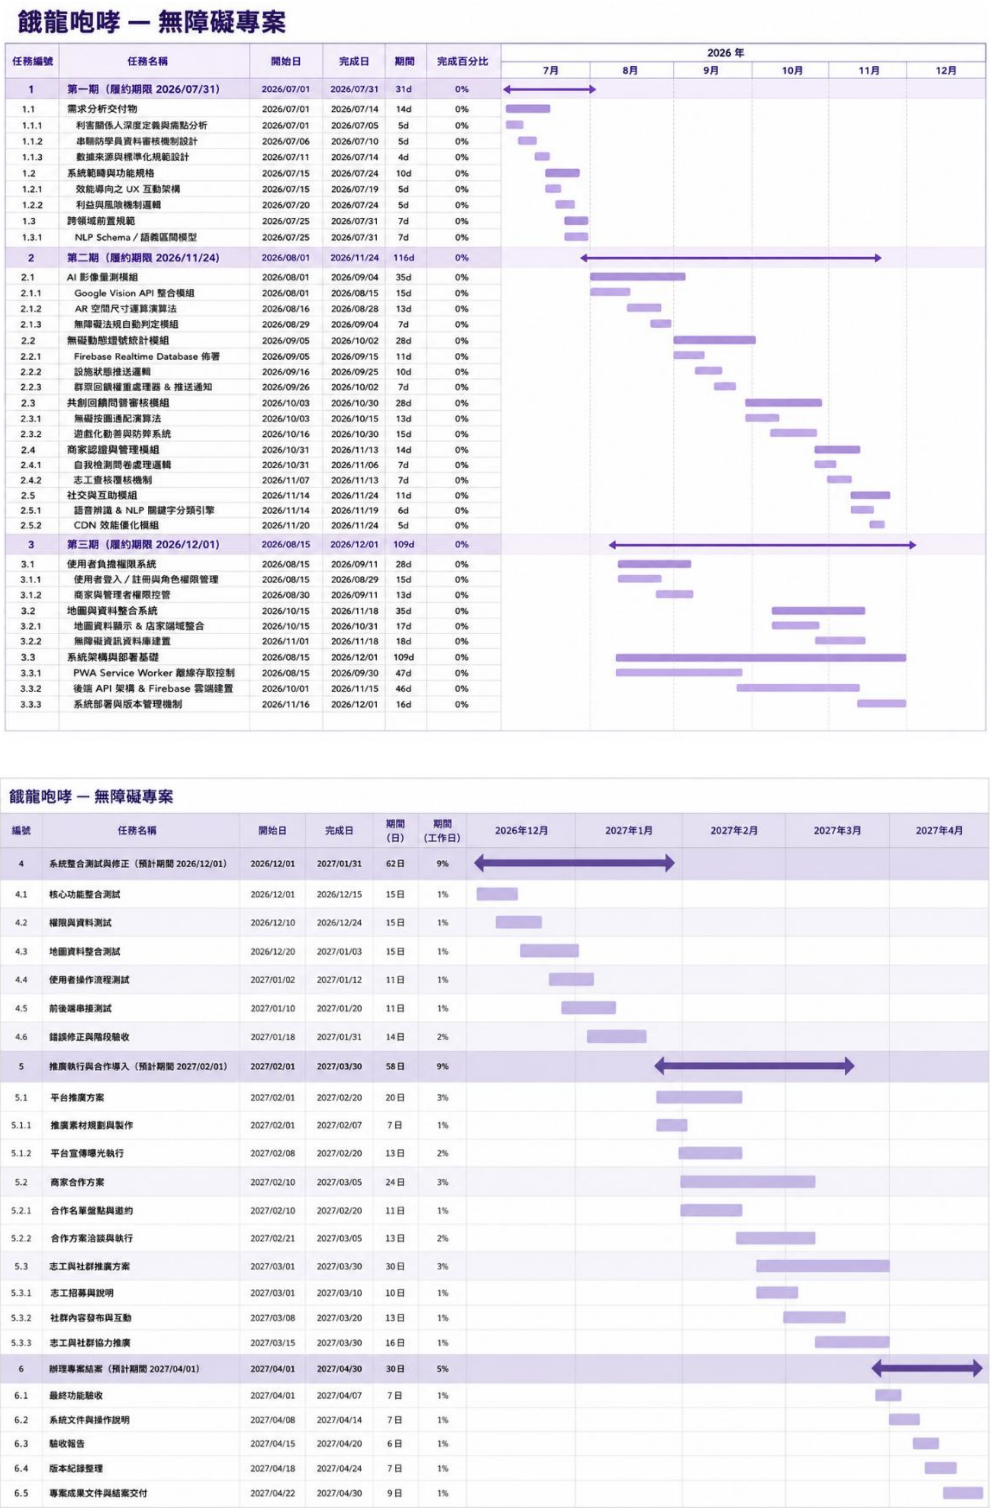


圖 3-1 任務甘特圖

第4章 專案團隊管理

4.1 專案組織架構

本專案由餓龍咆哮團隊共七名成員組成，設置專家顧問與專案總監作為高階督導層，下設專案經理統籌執行，並依功能分工明確定義各成員職責，如下表 4-1 所示：

表 4-1 專案組織架構表

成員	編號	職能角色	主要工作職掌
林建志	A11200001	專家顧問	提供無障礙法規諮詢、審查技術架構合規性、指導 AI 模組研發方向
蔡明哲	A11200002	專案總監	督導整體專案執行品質、審核各里程碑交付成果、對委辦單位負責
王雅婷	A11200003	專案經理 (PM)	統籌專案計畫、時程管控、風險管理、利害關係人溝通、永續指標稽核
李佳穎	A11200004	前端工程師	Figma 介面設計、RWD 響應式規範、設計系統制定、使用者測試
張智凱	A11200005	前端工程師	PWA 前端開發、React/Vue.js 實作、Google Maps API 整合、效能優化
陳柏宇	A11200006	後端/AI 工程師	Firebase 後端架構、Google Vision API 整合、AI 量測模組、NLP 語音辨識
吳怡君	A11200007	系統測試/推廣	系統測試規劃、品質管理、推廣與志工招募



圖 4-1 專案組織架構表

4.2 各功能組別及人員職掌

詳細人員職責，如下圖 4-2 所示

表 4-2 各功能組別及人員職掌

職能角色 / 功能分組	負責人員	任務工作
顧問組 (Advisory)	林建志	無障礙法規審查、技術架構諮詢、AI 模組合規指導
專案管理組 (PM)	蔡明哲、王雅婷	計畫撰寫、進度追蹤、風險評估、里程碑控管、永續指標稽核
設計組 (Design)	李佳穎	使用者研究、Persona 建立、Empathy Map、Figma 原型設計、無障礙 UX 規範
前端開發組 (Frontend)	張智凱	PWA 開發、地圖介面、動態燈號、社交揪團功能、離線存取
後端/AI 開發組 (Backend/AI)	陳柏宇	Firebase 架構、Vision API、AR 量測演算法、Geofencing 防弊、NLP 語音分類
測試組 (QA/Ops)	吳怡君	功能整合測試、使用者實測、系統部署、CDN 監控、資料備份
推廣組 (Marketing)	蔡明哲、吳怡君	志工招募培訓、商家合作協議、QR Code 推廣、社群行銷

第5章 專案預算規劃

5.1 專案總經費

本專案總工作期程自 115 年 7 月 1 日起，至 116 年 4 月 30 日止，估算 7 個月，依本專案經費額度內，參照行政院主計總處「資訊服務委外經費估算原則」，估算總經費預算為新臺幣 853,090 元整（含稅）。

各工作投入人力成本係參照勞動部 113 年 7 月職類別薪資調查結果「專業、科學及技術服務業」項下「研究發展服務業」實際總薪資估算。

5.2 各功能模組經費彙整表

如底下表 5-1 所示，這個專案的總預算為 853,090 元新台幣。

表 5-1 各功能模組經費彙整表

項次	分項工作	金額（元）
1	AI 影像量測模組	169,579.00
2	無礙動態燈號與路線服務	102,729
3	無障礙資料分析與資料建置	170,929.00
4	系統平台與後台管理建置	71,758
5	資料介接與地圖服務整合	102,729
6	系統測試與資訊安全防護	43,134
7	推廣與客服服務	118,554
8	專案管理	137,581.00
9	教育訓練	76,000
	合計	992,993

單位：新台幣（元）

5.3 人員薪資對應表

依勞動部 113 年 7 月職類別薪資統計，本專案人員薪資對應如下表 5-2 所示：

表 5-2 人員薪資對應表

勞動部職類別	月薪（元）	對應專案職稱
(312190) 監督人員（含科/股長）	72,957	專家顧問、中階主管、專案經理
(250000) 資訊及通訊專業人員	71,758	系統分析師、資料庫設計師
(200000) 專業人員	68,739	AI 工程師、程式設計師
(243100) 廣告及行銷專業人員（含企劃）	53,639	行銷企劃
(422400) 電話及網路客服人員	38,095	客服人員

單位：新台幣(元)

5.4 各功能細項分析表

各工作投入人力成本係參照勞動部 113 年 7 月職類別薪資調查結果「專業、科學及技術服務業」項下「研究發展服務業」實際總薪資估算。各職類薪資依實際職務性質分別對應，以反映不同專業層次之市場行情。下表 5-3 提供了工作單價的明細：

表 5-3 各項工作單價分析

服務項目	勞動部職類別（代碼）	人員規格	單價（元）	單位	數量	合計（元）
AI 影像量測模組	(250000) 資訊及通訊專業人員	系統分析師	71,758	人月	0.5	35,879
	(251000) 軟體開發人員（應用）	程式設計師	66,850	人月	2	133,700
無礙動態燈號與路線服務	(250000) 資訊及通訊專業人員	系統分析師	71,758	人月	0.5	35,879
	(251000) 軟體開發人員（應用）	程式設計師	66,850	人月	1	66,850
無障礙資料分析與資料建置	(251000) 軟體開發人員（應用）	程式設計師	66,850	人月	1	66,850
	(252000) 資料庫及網路專業人員	資料庫設計師	68,200	人月	1	68,200

服務項目	勞動部職類別（代碼）	人員規格	單價（元）	單位	數量	合計（元）
	(250000) 資訊及通訊專業人員	系統分析師	71,758	人月	0.5	35,879
資料介接與地圖服務整合	(312190) 監督人員（含科/股長）	專家顧問	72,957	人月	1	71,758
系統平台與後台管理建置	(250000) 資訊及通訊專業人員	系統分析師	71,758	人月	0.5	35,879
	(251000) 軟體開發人員（應用）	程式設計師	66,850	人月	1	66,850
系統測試與資訊安全防護	(351090) 資訊管理及維護技術員	資訊管理及維護技術員	43,134	人月	1	43,134
推廣與客服服務	(422400) 電話及網路客服人員	客服人員	38,095	人月	1	38,095
	(243100) 廣告及行銷專業人員（含企劃）	行銷企劃	53,639	人月	1.5	80,459
專案管理	(312190) 監督人員（含科/股長）	中階主管	72,957	人月	1	72,957
	(242100) 專案管理師	專案經理	64,624	人月	1	64,624
教育訓練	—	場地費	10,000	場次	2	40,000
	—	講義編輯及印製	200	人次	60	12,000
	—	餐點	400	人次	60	24,000
總計						992,993

單位：新台幣（元）

第6章 專案品質管理

6.1 品質規劃

本專案依據 PMBOK 品質管理知識領域，建立完整品質管理計畫，確保交付成果符合無障礙標準規範與使用者需求。

在線下量測標準方面，全面參照身心障礙者權益保障法及無障礙設施設置辦法等相關法令實作；平台介面則嚴格遵循國際無障礙操作規範（WCAG 2.1 AA 等級），提供高對比模式、大按鈕與語音輔助等多功能友善設計。此外，針對後端數據治理，系統建立一套語意標籤規範以確保資料規格之一致性，並結合信賴區間演算法動態調整數據權重，使整體使用者回報資訊之正確率與實用性持續維持在極高水準。

6.2 品質保證

- Code Review 機制：每個 Sprint 結束前進行代碼審查，確保程式品質。
- 輪椅族實測驗證：邀請真實輪椅使用者進行測試，確保使用者體驗符合實際需求。
- 防弊機制驗證：測試 GPS 地理圍欄、評估平台演算法與異常行為偵測的準確性。
- 教育訓練品質：志工培訓，確保志工具備 AI 量測工具操作能力及回報規範認知。

6.3 品質管制

- 自動化測試：建立前後端 API 自動化測試，確保功能迴歸無誤。
- 效能監控：持續監控流量，確保在預算（預備金 7%）內穩定運作。
- 資料備份：建立雲端資料庫每日自動備份流程，預防突發性數據遺失。
- 燈號準確率 KPI 追蹤：統計無礙動態燈號之回報準確率，目標維持 95% 以上。

第7章 專案管理規劃

7.1 需求變更管理

本專案採用敏捷式開發（Agile）搭配結構化需求變更流程：

- 變更申請：任何功能變更需填寫變更申請單，說明變更原因、影響範圍與預估工時。
- 影響評估：PM 與相關開發成員評估對時程、預算及品質的影響。
- 核准機制：由 PM 與委辦單位共同確認後方可執行變更。
- 文件更新：變更核准後，同步更新 WBS、時程基準與預算計畫。

7.2 風險分析與因應對策

表 7-1 風險分析因應對策

編號	風險項目	發生機率	影響程度	因應對策
R1	串謀刷評：店家與使用者串謀提交假資訊	中	高	導入 GPS 地理圍欄（50m 範圍）、Trust Score 演算法、異常行為偵測與第三方志工複核流程
R2	API 費用超支：Google Maps/Vision API 費用超出預算	中	中	預留 7%預備金、CDN 流量監控、Lazy Loading 降低 API 呼叫頻率
R3	資料老化：無障礙設施資訊未即時更新	高	高	自動化過期偵測推播、群眾外包信賴區間模型、遊戲化機制激勵持續回報
R4	使用者採用率低：輪椅族不熟悉科技工具	中	高	PWA 免下載設計、大按鈕/語音操作優化、志工輔助推廣、與社福單位合作推廣
R5	AI 誤判：量測結果不準確影響信賴度	中	高	使用者手動修正機制、誤判樣本收集再訓練、志工複核機制

7.3 教育訓練計畫

本專案規劃辦理 8 場教育訓練，涵蓋志工培訓與商家操作說明如表 7-2 教育訓練規劃：

表 7-2 教育訓練規劃

場次	訓練內容	對象	人數	時間
1-3	AI 量測工具操作訓練 (Vision API 使用、AR 量測步驟)	無礙資訊志工	30 人	第 7 個月
4-5	環境回報規範訓練 (無障礙標準、GPS 圍欄說明)	無礙資訊志工	30 人	第 7 個月
6-7	商家後台操作說明 (自我健康檢查表、QR Code 設定)	合作商家管理員	30 人	第 6-7 個月
8	系統操作綜合演練與 Q&A	所有參與者	30 人	第 7 個月

7.4 系統部署與保固

- 部署環境：後端採雲端運算服務平台，前端採漸進式網頁應用程式，以及使用雲端作為即時資料庫。
- 版本管理：採用 Git 版本控制，每個里程碑建立版本分支，確保回溯能力。
- 系統保固：正式上線後提供 3 個月免費維護服務，包含 Bug 修正、效能調優與資料備份監控。
- 保密措施：所有使用者個人資料依個資法規定儲存與處理，API 金鑰採環境變數方式管理。

第8章 有助於本案執行之事項及建議

8.1 創意加值服務

8.1.1 AI 影像量測突破主觀描述問題

傳統無障礙資訊常以「有點陡」、「好像很高」等主觀描述呈現，本專案透過整合 Google Vision API 與 AR 空間演算法，實現一鍵拍照即可獲得客觀量測數據（門檻高度精確至 mm、坡度比例精確至%），有效打破主觀描述的模糊性。

8.1.2 低人事成本的永續維護機制

透過遊戲化勳章系統（無礙點數、數位徽章）驅動社群持續貢獻，結合群眾外包信賴區間演算法（目標 95% 準確率），預計累積大量數據，大幅降低專職人員實地查核頻次，實現低人事成本的永續資訊維護。

8.1.3 商家整合生態系

透過「無礙認證」標章制度，協助商家建立品牌公益形象，並提供流量優先排序獎勵機制，形成平台使用者、商家、志工三方共贏的生態系，確保平台長期可持續營運。

8.1.4 離線存取支援偏鄉與低網速環境

採用 PWA Service Worker 技術實現離線地圖緩存，即使在交通節點或偏鄉網路不穩定的環境下，使用者仍可查看已讀取的無障礙資訊，大幅提升實用性。

8.2 建議事項

本平台規劃與交通主管機關建立 Open Data 共享協議以加速初期資料建置，並攜手各縣市身障福利組織以快速觸及核心用戶、降低取得成本，同時積極申請身心障礙輔助科技相關補助計畫來擴大經費來源與社會公信力，中長期則預期對接主流地圖平台之 API，全方位提升平台的曝光度與使用便利性。

參考文獻

1. [Firebase Documentation, Realtime Database, Google, 2024.](#)
2. [Google Cloud Platform, Vision API Documentation, 2024.](#)
3. [Project Management Institute \(PMI\), A Guide to the Project Management Body of Knowledge \(PMBOK® Guide\), 6th ed., 2017.](#)
4. [內政部，身心障礙者權益保障法，2021。](#)
5. [內政部，無障礙設施設計規範，2023。](#)
6. [行政院主計總處，資訊服務委外經費估算原則，2023](#)
7. [勞動部，113 年 7 月職類別薪資調查結果「研究發展服務業」，2024](#)

附錄 A 系統雛型網站

網站連結：<https://gemini.google.com/share/bd4e9ad5691d>

附錄 B

社會創新：NPOhub

輔仁大學 資訊管理系 資訊系統專案管理 課程

活動名稱	NPO 專家講座：使用者需求訪談
活動日期	☐ 2026/3/19 (四) 10:10 ~ 12:00 財團法人興毅社會福利慈善事業基金會 ☒ 2026/3/26 (四) 10:10 ~ 12:00 北台灣無障礙運輸產業工會
活動地點	樹德樓 LW211
發言組別	餓龍咆哮

會議記錄

諮詢提綱	回覆摘要
有沒有什麼標準的規範，讓我們知道這間餐廳或環境對於無障礙者來說是方便的？	● 可參考建築物無障礙法規標準 ● 鼓勵商家做對輪椅族友善的建築標準 ● 讓真正的輪椅族去使用，來做評判的標準
